


**Window/Roof Replacement (Main Entrance & Colonnade), Elevator Refurbishing & Interior Sloped Sill Modification (Canadian Gallery Mezzanine)  
Project Timeline (w/two week closure in January)**

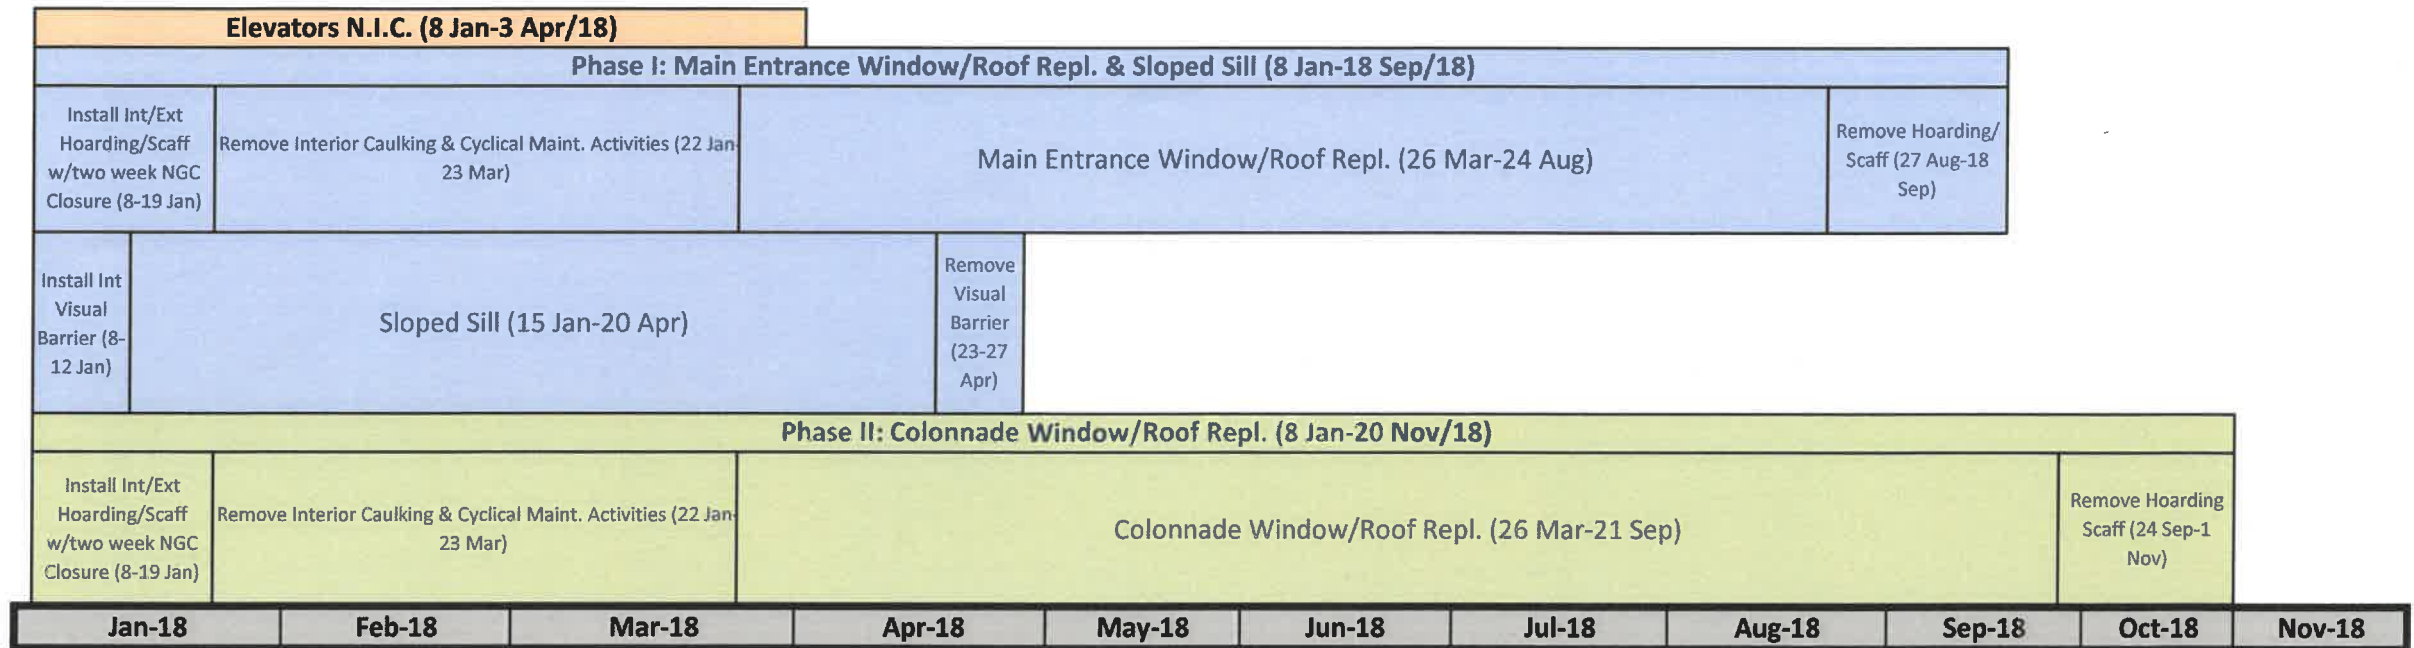

**Remplacement des fenêtres/du toit (Colonnade et entrée principale), remise en état des ascenseurs et modification de l'appui en pente à l'intérieur (mezzanine de la salle d'art canadien)**

**Échéancier de projet (avec clôture de projet de deux semaines en janvier)**

Ascenseurs – hors contrat (du 8 janv. au 3 avril 2018)										
Phase I : Remplacement des fenêtres/du toit de l'entrée principale et appui en pente (du 8 janv. au 18 sept. 2018)										
Installation des échafaudages et des palissades int./ext.; clôture de deux semaines MBAC (du 8 au 19 janv.)	Enlèvement du produit de calfeutrage à l'intérieur et travaux d'entretien périodiques (du 22 janv. au 23 mars)		Remplacement des fenêtres/du toit de l'entrée principale (du 26 mars au 24 août)						Enlèvement des échafaudages/palissades (du 27 août au 18 sept.)	
Installation d'une barrière visuelle à l'intérieur (du 8 au 12 janv.)	Appui en pente (du 15 janv. au 20 avril)			Enlèvement de la barrière visuelle (du 23 au 27 avril)						
Phase II : Remplacement des fenêtres/du toit de la Colonnade (du 8 janv. au 20 nov. 2018)										
Installation des échafaudages et des palissades int./ext.; clôture de deux semaines MBAC (du 8 au 19 janv.)	Enlèvement du produit de calfeutrage à l'intérieur et travaux d'entretien périodiques (du 22 janv. au 23 mars)		Remplacement des fenêtres/du toit de la Colonnade (du 26 mars au 21 sept.)						Enlèvement des échafaudages et des palissades (du 24 sept. au 1er nov.)	
Janvier 2018	Février 2018	Mars 2018	Avril 2018	Mai 2018	Juin 2018	Juillet 2018	Août 2018	Sept. 2018	Oct. 2018	Nov. 2018

## WINDOW/ROOF REPLACEMENT (COLONNADE & MAIN ENTRANCE) & Sloped Sill (Canadian Gallery Mezzanine)

Capital (96)  
(Tender Ready)

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2016												2017												2018											
					Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
1																																								
2	<b>Glazing/Roof Repl (Colonnade &amp; Main Entr), Sloped Sill &amp; Elevators</b>	<b>434 days?</b>	<b>Mon 17-03-06</b>	<b>Thu 18-11-01</b>																																				
3	<b>Tendering - Construction</b>	<b>105 days?</b>	<b>Mon 17-03-06</b>	<b>Fri 17-07-28</b>																																				
4	<b>ITT Contract (Buy-N-Sell): Glazing/Roof Repl. &amp; Sloped Sill (Col &amp; Main Entr.)</b>	<b>105 days?</b>	<b>Mon 17-03-06</b>	<b>Fri 17-07-28</b>																																				
17	<b>Implementation - Construction</b>	<b>328 days?</b>	<b>Mon 17-07-31</b>	<b>Wed 18-10-31</b>																																				
18	<b>Glazing/Roof Repl. &amp; Sloped Sill (Colonnade &amp; Main Entr.)</b>	<b>328 days?</b>	<b>Mon 17-07-31</b>	<b>Wed 18-10-31</b>																																				
19	<b>Pre-Construction Phase</b>	<b>140 days?</b>	<b>Mon 17-07-31</b>	<b>Fri 18-02-09</b>																																				
32	<b>Phase 1: Main Entr. &amp; Sloped Sill Const. Impl. (Incl. Mob. &amp; Demobilization)</b>	<b>181 days?</b>	<b>Mon 18-01-08</b>	<b>Mon 18-09-17</b>																																				
33	Erect Hoarding & Scaffolding - Interior/Exterior	10 days?	Mon 18-01-08	Fri 18-01-19																																				
34	Erect Visual Hoarding Barrier (Sloped Sill)	5 days?	Mon 18-01-08	Fri 18-01-12																																				
35	Sloped Sill Construction	70 days?	Mon 18-01-15	Fri 18-04-20																																				
36	Remove Visual Hoarding Barrier (Sloped Sill)	5 days	Mon 18-04-23	Fri 18-04-27																																				
37	<b>Sloped Sill Completed</b>	<b>1 day?</b>	<b>Mon 18-04-30</b>	<b>Mon 18-04-30</b>																																				
38	Remove Interior Caulking (Main Entrance)	10 days?	Mon 18-01-22	Fri 18-02-02																																				
39	Cyclical Maintenance Activities (Main Entrance) - * Note: Exception for Sails & Blinds Sequencing	35 days?	Mon 18-02-05	Fri 18-03-23																																				
40	Window & Roof Repl.	110 days?	Mon 18-03-26	Fri 18-08-24																																				
41	Remove Hoarding & Scaffolding	15 days?	Mon 18-08-27	Fri 18-09-14																																				
42	<b>Hoarding &amp; Scaffolding Removal Completed</b>	<b>1 day?</b>	<b>Mon 18-09-17</b>	<b>Mon 18-09-17</b>																																				
43	<b>Main Entrance Desk Operational &amp; NGC Final Clean</b>	<b>1 day?</b>	<b>Mon 18-09-17</b>	<b>Mon 18-09-17</b>																																				
44	<b>Phase 2: Colonnade Const. Impl. Continue (Incl. Mob. &amp; Demobilization)</b>	<b>213 days?</b>	<b>Mon 18-01-08</b>	<b>Wed 18-10-31</b>																																				
45	Erect Hoarding & Scaffolding - Interior/Exterior	10 days?	Mon 18-01-08	Fri 18-01-19																																				
46	Remove Interior Caulking (Colonnade)	10 days?	Mon 18-01-22	Fri 18-02-02																																				
47	Cyclical Maintenance Activities (Colonnade)	35 days?	Mon 18-02-05	Fri 18-03-23																																				
48	Window & Roof Replacement	142 days?	Mon 18-03-26	Tue 18-10-09																																				
49	Remove Hoarding & Scaffolding	15 days?	Wed 18-10-10	Tue 18-10-30																																				
50	<b>Hoarding &amp; Scaffolding Removal Completed</b>	<b>1 day?</b>	<b>Wed 18-10-31</b>	<b>Wed 18-10-31</b>																																				
51	<b>Project Completed</b>	<b>1 day?</b>	<b>Thu 18-11-01</b>	<b>Thu 18-11-01</b>																																				

Project: 87636, 87637 & 87638 Project No.: Capital (96) Date: Fri 17-03-03	Task  Project Summary Split  External Tasks Milestone  External Milestone Summary  Inactive Task	Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only	Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only	Progress Deadline  	
--	---	--	--	------------------------------	--

REPLACEMENT DES FENÊTRES/DU TOIT (COLONNADE ET ENTRÉE PRINCIPALE) et appui en pente (Mezzanine de la salle d'art canadien)

Immobilisations (96)  
(Étape de l'appel d'offres)

Identification	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2016	2017	2018
1					Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre	Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre	Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre
2	Remplacement du toit/vitrage (Colonnade et entrée principale), appui en pente et ascenseurs	434 jours?	Lundi, 17-03-06	Jeudi, 18-11-01			
3	Appel d'offres – Construction	105 jours?	Lundi, 17-03-06	Vendredi, 17-07-28			
4	Invitation à soumissionner (Achats et ventes) : Remplacement du toit/vitrage et appui en pente (Colonnade et entrée principale)	105 jours?	Lundi, 17-03-06	Vendredi, 17-07-28			
17	Mise en oeuvre – Construction	328 jours?	Lundi, 17-07-31	Mercredi, 18-10-31			
18	Remplacement du toit/vitrage et appui en pente (Colonnade et entrée principale)	328 jours?	Lundi, 17-07-31	Mercredi, 18-10-31			
19	Phase de préparation des travaux	140 jours?	Lundi, 17-07-31	Vendredi, 18-02-09			
32	Phase 1: Mise en oeuvre des travaux à l'entrée principale et à l'appui en pente (y compris mob. et démobilitation)	181 jours?	Lundi, 18-01-08	Lundi, 18-09-17			
33	Montage des échafaudages et des	10 jours?	Lundi,	Vendredi,			

	palissades – intérieur/extérieur		18-01-08	18-01-19			
34	Montage de la barrière visuelle des palissades (appui en pente)	5 jours?	Lundi, 18-01-08	Vendredi, 18-01-12			
35	Construction de l'appui en pente	70 jours?	Lundi, 18-01-15	Vendredi, 18-04-20			
36	Enlèvement de la barrière visuelle des palissades (appui en pente)	5 jours?	Lundi, 18-04-23	Vendredi, 18-04-27			
37	Achèvement de l'appui en pente	1 jour?	Lundi, 18-04-30	Lundi, 18-04-30			
38	Enlèvement du produit de calfeutrage à l'intérieur (entrée principale)	10 jours?	Lundi, 18-01-22	Vendredi, 18-02-02			
39	Travaux d'entretien périodiques (entrée principale) - *Note: à l'exception de la séquence en rapport avec les voiles et les stores	35 jours?	Lundi, 18-02-05	Vendredi, 18-03-23			
40	Remplacement des fenêtres/du toit	110 jours?	Lundi, 18-03-26	Vendredi, 18-08-24			
41	Enlèvement des palissades et des échafaudages	15 jours?	Lundi, 18-08-27	Vendredi, 18-09-14			
42	Achèvement de l'enlèvement des palissades et des échafaudages	1 jour?	Lundi, 18-09-17	Lundi, 18-09-17			
43	Nettoyage final du MBAC et mise en œuvre opérationnelle du bureau à l'entrée principale	1 jour?	Lundi, 18-09-17	Lundi, 18-09-17			
44	Phase 2: suite de la mise en œuvre des travaux à la Colonnade (y compris mob. et démobilisation)	213 jours?	Lundi, 18-01-08	Mercredi, 18-10-31			
45	Montage des échafaudages et des palissades – intérieur/extérieur	10 jours?	Lundi, 18-01-08	Vendredi, 18-01-19			
46	Enlèvement du produit de calfeutrage à l'intérieur (Colonnade)	10 jours?	Lundi, 18-01-22	Vendredi, 18-02-22			
47	Travaux d'entretien périodiques (Colonnade)	35 jours?	Lundi, 18-02-05	Vendredi, 18-03-23			
48	Remplacement des fenêtres/du toit	142 jours?	Lundi,	Mardi,			

			18-03-26	18-10-09			
49	Enlèvement des palissades et des échafaudages	15 jours?	Mercredi, 18-10-10	Mardi, 18-10-30			
50	Achèvement de l'enlèvement des palissades et des échafaudages	1 jour?	Mercredi, 18-10-31	Mercredi, 18-10-31			
51	Achèvement du projet	1 jour?	Jeudi, 18-11-01	Jeudi, 18-11-01			

Projet : 87636, 87637 et 87638 N° de projet : Capital (96) Date : vendredi, 17-03-03	Tâche	Récapitulatif du projet	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Avancement
	Fractionnement	Tâches externes	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Échéance
	Jalon	Jalon externe	Tâche manuelle	Début uniquement	
	Récapitulatif	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	
